

## ALGERIE TELECOM

### DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE

#### SOUS DIRECTION TECHNIQUE--DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES


#### RESEAU URBAIN

#### TELEX

<b>De :</b> Mr LE DOT DE CONSTANTINE	
<b>A :</b> ETP BENDJABALLAH TAREK sise, cite Bekira 3eme tranche N°126-Constantine	
<b>Copie à :</b> Mr le Directeur du CMP KHROUB	<b>Visa :</b>
<b>Réf :</b> AT/DOT-CNE/SDTO/DRA/RU-ODN/049/2023	
<b>Date :</b> 06/09/2023	
<b>Objet :</b> MISE EN DEMEURE	
<b>Suivi Par :</b> DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES	

SUITE AU RETARD CONSIDERABLE ENREGISTRE TRAVAUX MODERNISATION CITE OUED HMIMIM ODN DISTRIBUTION ET TRANSPORT STOP TRAVAUX NON ACHEVES A CE JOUR STOP DEPASSEMENT DE DELAI CONTRACTUEL (45 JOURS) STOP CADENCE TRES LENTE DES TRAVAUX STOP VOUS METS EN DEMEURE DE RENFORCER L'EFFECTIF STOP D'ACHEVER LES TRAVAUX DU CHANTIER DANS UN DELAI DE 48 HEURES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA PRESENTE LETTRE STOP FAUTE DE QUOI DES MESURES SERONT PRISES A VOTRE ENCONTRE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR STOP URGENCE SIGNALE STOP ET FIN .

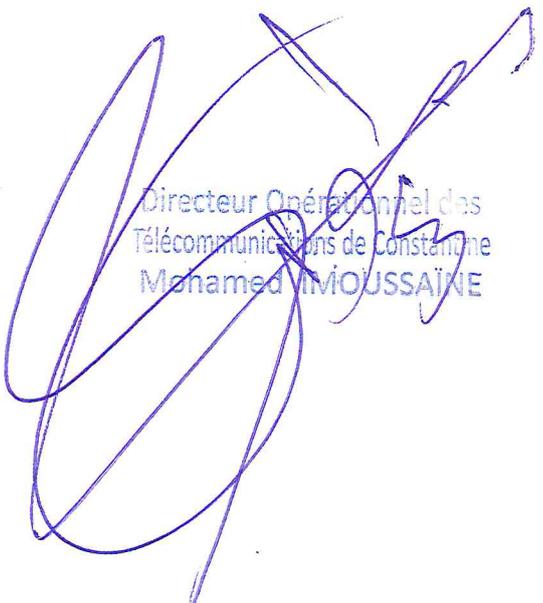

  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Constantine  
Mohamed MIOUSSAINE
